


SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LEONIDES DE ASIS), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ARQ. LUIS ARTURO JIMENEZ LOPEZ, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: ARQ. LUIS ARTURO JIMENEZ LOPEZ, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. ISRAEL HERNANDEZ GARCIA, C. VIVIANO MIGUEL MIGUEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. CARLOS ALBERTO LEYVA GIRON, TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA COLONIA LEONIDES DE ASIS.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA DISTRITO: (006) TUXTEPEC.  
REGION: (005) PAPALOAPAN. MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.  
LOCALIDAD: (001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LEONIDES DE ASIS)



II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 28: PARTICIPACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
RUBRO: URBANIZACION (PUENTE) CUENTA PRESUPUESTAL:  
OFICIO DE APROBACIÓN No. R28/MSJBT/20184/2023/006 FECHA:  
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: INVITACION RESTRINGIDA  
NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-IR/R28-001/2023 FECHA: 03-jun-23  
CONVENIO AL CONTRATO: FECHA:  
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 12-jun-23 INICIO REAL: 12-jun-23  
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 25-ago-23 TERMINACION REAL: 09-sep-23  
PERIODO DE RECALENDARIZACION: 26-ago-23 AL 09-sep-23

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA COLONIA LEONIDES DE ASIS, UBICADA EN LAS CALLES 18 DE OCTUBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LEONIDES DE ASIS) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTES DE ESTRUCTURAS, DESMONTE Y/O DESHIERBE POR MEDIOS MANUALES, DESMATELAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA, DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE CONCRETO SIMPLE EN DIFERENTES RESISTENCIAS. CIMENTACION; EXCAVACION MANUAL, CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO, ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO, OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE LA BASE HIDRAULICA. ESTRUCTURA DE CONCRETO; MURO DE CONCRETO ARMADO MA01, MA02, MURO DE CONCRETO ARMADO ACABADO APARENTE. ESTRUCTURA DE ACERO; SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR DE DISTINTAS SECCIONES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA BASE DE ACERO A 36 DISTINTAS SECCIONES, SUMINISTRO, COLOCACION Y NIVELADO DE VIGAS IPR, DE DIFERENTES MEDIDAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA SECUNDARIA A BAE DE PTR, ATIEZADORES A BASE DE ATIEZADORES, LOSACERO TERNIUM, BASE DE PASAMANOS SUPERIOR DE SOLERA, ACCESOS; SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLARDO FIJO, EXCAVACION MANUAL, CONSTRUCCION DE GUARNICION DE SECCION TRAPEZOIDAL, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR, CONSTRUCCION DE BANQUETA A BASE DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE, CONSTRUCCION DE CUNETAS A BASE DE FIRME, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO, ILLUMINACION; SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PIRAMIDAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PARA ALUMBRADO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO EAD CORRUGADO DE 2", SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CONICO CIRCULAR DE 4 M SUMINISTRO E INSTALACION CABLE AL, DE CABLE THW CAL 12, LUMINARIA LAMPARA URBANA LED, LUMINARIA NIGHT FALCON, PLACA DE 1.20 X 0.80 M CAL. 14. TERRACERIAS; RASTREO CON MAQUINARIA PESADA, CONFORMACION Y AFINE DE LA SUPERFICIE DE TERRENO PARA EL EQUIPO MECANICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAPAS METALICAS PARA SOSTENER TUBERIAS. LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGAR LA OBRA.

METAS ALCANZADAS

SE CONSTRUYO UN PUENTE PEATONAL DE 18.00 MTS X 2.20 MTS, SE REALIZARON TRABAJOS DE LOSA DE CIMENTACION, ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO (MUROS), ESTRUCTURAS DE ACERO CON VIGAS IPR 18X 6" EN LARGUEROS Y TENSORES IPR 12X 6 1/2" COMO TRABESANOS, ESTRUCTURA SECUNDARIA CON PTR 6X2", LOSASERO TERNIUM CALIBRE 22 Y COLOCACION DE CONCRETO F' C= 250 KG/CM2; EN ACCESOS; 12.60 ML DE GUARNICION 15.00X20.00X40.00 CMS F' C= 200 KG/CM2 Y 20.54 M2 DE BANQUETA F' C= 150 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR.

BENEFICIARIOS:

**SINDICO HACENDARIO**  
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec.  
Dtto. Tuxtepec, Oax.  
2022-2024

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec,  
Dtto Tuxtepec Oax  
2022-2024

**COMITÉ VECINAL**  
DE CONTROL  
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec.  
Dtto. Tuxtepec, Oax.  
2022-2024

*[Handwritten signatures and initials]*

ESTRUCTURA FINANCIERA					
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33					
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (RAMO 28)	\$ 1,658,427.73	\$ 1,651,334.66	\$ 1,651,334.66	\$ 1,651,334.66	\$
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,658,427.73</b>	<b>\$ 1,651,334.66</b>	<b>\$ 1,651,334.66</b>	<b>\$ 1,651,334.66</b>	<b>\$</b>

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 495,400.40 INCLUYE I.V.A.

**TUXTEPEC**  
TIERRA DE BIENESTAR  
**COMITÉ VECINAL**  
**COLONIA LEONIDES DE ASIS**  
2022-2024  
**SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA**

**III.- RELACION DE LAS GARANTIAS**

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	
ANTICIPO	23A27955	03/06/2023	\$495,400.40	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.
CUMPLIMIENTO	23A27961	03/06/2023	\$165,133.47	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.
VICIOS OCULTOS	23A67752	15/09/2023	\$165,133.47	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.

**TUXTEPEC**  
TIERRA DE BIENESTAR  
**COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL**  
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec  
Dto. Tuxtepec Oax.

**IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS**

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL										
1 (UNO)	12/06/2023	11/07/2023	\$486,703.36	\$ -	\$ -	\$486,703.36	\$ 77,872.54	\$ 564,575.90	\$ 169,372.77	\$ 2,433.52	\$ 2,593.80	\$ 390,175.81
2 (DOS)	12/07/2023	10/08/2023	\$652,207.86	\$ -	\$ -	\$652,207.86	\$ 104,353.26	\$ 756,561.12	\$ 226,968.34	\$ 3,261.04	\$ 3,476.11	\$ 522,855.63
3 (TRES FINIQUITO)	11/08/2023	09/09/2023	\$284,653.14	\$ -	\$ -	\$284,653.14	\$ 45,544.50	\$ 330,197.64	\$ 99,059.29	\$ 1,423.27	\$ 1,516.56	\$ 228,198.55
<b>TOTALES</b>			<b>\$1,423,564.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,423,564.36</b>	<b>\$227,770.30</b>	<b>\$1,651,334.66</b>	<b>\$495,400.40</b>	<b>\$7,117.83</b>	<b>\$7,586.44</b>	<b>\$1,141,229.99</b>

**PRESENCIA MUNICIPAL**  
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec  
Dto. Tuxtepec, Oax  
2022-2024

**TUXTEPEC**  
TIERRA DE BIENESTAR  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec,  
Dto. Tuxtepec Oax  
2022-2024

**TUXTEPEC**  
TIERRA DE BIENESTAR  
**ORGANO INTERNO DE CONTROL**  
Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec,  
Dto. Tuxtepec, Oax  
2022-2024

**SINDICO HACENDARIO**  
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec,  
Dto. Tuxtepec, Oax.  
2022-2024

**V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.


LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.


UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:

(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

  
 LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 Tuxtepec  
 Oaxaca, Oax  
 2022-2024

  
**SINDICO HACENDARIO**  
 Ing. ROGELIO GOMEZ CASTILLO  
 SINDICO HACENDARIO  
 Dto. Tuxtepec, Oax  
 2022-2024

  
 DR. EMILIO BRAVO GRAJALES  
 DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO  
 CED. PROF. No. 3641403  
 Tuxtepec Oax  
 2022-2024

RECIBE LA OBRA  
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIACION SOCIAL)

  
 C. ISRAEL HERNANDEZ GARCIA  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ


  
 C. VIVIANO MIGUEL MIGUEL  
 SECRETARIO DEL COMITÉ


(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL COMO VISOR)

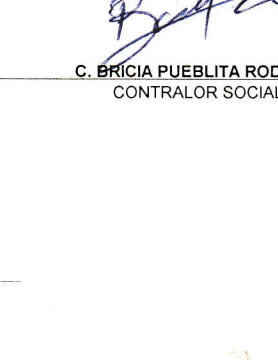
  
 LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA  
 CONTRALORA INTERNO MUNICIPAL  
 San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax  
 2022-2024


FOR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL


  
 C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ  
 CONTRALOR SOCIAL

  
 C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ  
 CONTRALOR SOCIAL

  
**COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL**  
 Mdo. de San Juan  
 Bautista, Tuxtepec  
 Oaxaca  
 C. CARLOS ALBERTO LEYVA GIRON  
 DIRECTOR SOCIAL

  
**TUXTEPEC**  
 TIERRA DE BIENESTAR  
**COMITÉ VECINAL**  
 COLONIA  
**LEONIDES DE ASIS**  
 2022-2024  
 SAN JUAN BAUTISTA  
 TUXTEPEC, OAXACA.

  
 ROSA CRISTOBAL ZAMORA  
 VOCAL

  
 BELTHA MIGUEL JUAREZ  
 VOCAL
