

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 27 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. AMIGOS CHARROS) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA: GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: C. FERNANDO UBIETA HERNANDEZ, INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, ROGELIO GOMEZ CASTILLO Y EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASI COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAUL SALUM ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE. ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA: RECONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO A LOMA ALTA TRAMO: E.C. A CERRO DE ORO-LIENZO CHARRO TRAMO 0+030 AL 0+121.90 EN LA COLONIA AMIGOS CHARROS.

Mpio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax 2022-2024

I.- UBICACION

ESTADO: (020) OAXACA DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
REGION: (005) PAPALOAPAN. MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. AMIGOS CHARROS)

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RECURSOS DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE) 2024
RUBRO: DRENAJE Y LETRINAS CUENTA PRESUPUESTAL:
N. DE OFICIO DE APROBACION: MSJBT/20184/CAPUFE/2024/001 FECHA: 08/08/2024
DICTAMEN TECNICO NUM: URC-ST-302/2024 FECHA: 07/08/2024
MODALIDAD DE EJECUCION: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NUMERO DE CONTRATO: MSJTB-20184-CAPUFE-006/2024 FECHA: 05/09/2024
CONVENIO NUM. FECHA:
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 09/09/2024 INICIO REAL: 09/09/2024
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 22/11/2024 TERMINACION REAL: 22/11/2024
DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

Gobierno Municipal
TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Mpio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax 2022-2024

PARA REALIZAR LA OBRA:

RECONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO A LOMA ALTA TRAMO: E.C. A CERRO DE ORO-LIENZO CHARRO TRAMO 0+030 AL 0+121.90 EN LA COLONIA AMIGOS CHARROS, UBICADA EN CAMINO A LOMA ALTA (FRENTE AL LIENZO CHARRO) EN LA LOCALIDAD DESAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. AMIGOS CHARROS), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACION DE TERRENOS EN CAMINOS Y CALLES, CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL, DEMOLICION CON MAQUINARIA DE CONCRETO SIMPLE FC= 250 KG/CM2, CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES EN MATERIAL TIPO II, DEMOLICION CON MAQUINARIA DE POZO DE VISITA TIPO EXISTENTE DE 4.01 HASTA 6.00 M DE PROFUNDIDAD, BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA SUMERGIBLE TIPO LODERA DE 7.5 H.P. DE 4" Ø DE DESCARGA, EXCAVACION EN CEPAS CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EXCAVACION EN CEPAS CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO II DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD, EXCAVACION EN CEPAS CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO II DE 4.01 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD, AFINE DE FONDO DE CEPAS EN EXCAVACION PARA RECIBIR TUBERIA, HASTA 5 CM DE ESPESOR. **INSTALACIONES SANITARIAS, TUBERIA PEAD;** SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, SUBMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 38 CM (15") Ø. **PRUEBA DE ESCURRIMIENTO;** PRUEBA DE ESCURRIMIENTO EN LA RED DE DRENAJE YA SEA PLUVIAL O SANITARIO. **RELLENOS;** ACOSTILLADO DE TUBERIA CON PRODUCTO DE BANCO (GRAVA EN GREÑA CON T.M.A. DE 1" Ø) EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARCILLA), COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO. **POZOS DE VISITA;** CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.2 M Ø INFERIOR, DE 4.50 A 4.74 M DE PROFUNDIDAD, RECONEXION DE POZO DE VISITA EN TUBERIA DE 20 CM Ø HASTA 60 CM Ø. **REPOSICION DE PAVIMENTO;** SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTÁNDAR) CON MAQUINARIA DE MATERIAL DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCION 90-10, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASAJUNTAS POR CIMBRA LONGITUDINAL A BASE DE REDONDO LISO DE 5/8" Ø CON LONGITUD DE 46 CM @ 30 CM C.A.C, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO CON RESISTENCIA RÁPIDA A 7 DÍAS A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO FC= 300 KG/CM2, MR=42 KG/CM2, CONSTRUCCION DE TOPE DE CONCRETO HIDRAULICO CON RESISTENCIA NORMAL FC= 250 KG/CM2, CORTES CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA FC= 250 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM, SELLO EN JUNTAS DE CORTES EN CONCRETO HIDRAULICO CON PROFUNDIDAD Y HASTA 1 CMS DE ANCHO. **AFECTACIONES;** REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" Ø. **LIMPIEZA CARGAS Y ACARREOS;** CARGA Y ACARREO DE MATERIALES SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA GENERAL. **DESCARGAS DOMICILIARIAS, PRELIMINARES;** TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA ESTRUCTURAS DE OBRAS HIDRAULICAS EN CAMINOS COMO, REDES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y PLUVIALES, ALOJAMIENTOS, CORTES CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA FC= 250 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM, DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA FC= 150 KG/CM2, EXCAVACION EN CEPAS MANUALES EN MATERIAL TIPO II SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. **INSTALACIONES SANITARIAS;** SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 150 MM (6") Ø, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE INSERCCION DE 150 MM (6") Ø CON MANGA DE SELLO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD. **REGISTROS SANITARIOS;** CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO CON SECCION DE 60 X 60 X 90 CM MEDIDAS INTERIORES, A BASE DE MUROS DE TABICON DE CONCRETO PESADO DE 10 X 14 X 28 CM DE SECCION. **RELLENOS;** RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO. **REPOSICION DE BANQUETA;** CONSTRUCCION DE BANQUETA A BASE DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE FC= 150 KG/CM2, CON T.M.A. DE 3/4" Ø, R.N. DE 10 CM DE ESPESOR. **LIMPIEZA CARGAS Y ACARREOS;** CARGA Y ACARREO DE MATERIALES SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA GENERAL.

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARON TRABAJOS DE: EN PRELIMINARES TRAZO Y NIVELACION, CORTES CON DISCO, DEMOLICION CON MAQUINARIA, EXCAVACIONES, AFINE; EN INSTALACIONES SANITARIAS (CAMA DE ARENA, 87.39 ML DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 38 CM (15") Ø); EN RELLENOS (26.25 M3 DE ACOSTILLADO CON GRAVA, 1,220.11 M3 DE RELLENO (ARCILLA); EN POZOS DE VISITA (1 PZAS DE POZOS DE VISITA DE DIF. PROFUNDIDADES); EN DESCARGAS SANITARIAS (35.40 ML DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 150 MM (6") Ø, 6.00 PZAS DE REGISTROS); EN PAVIMENTO (BASE HIDRAULICA, 629.36 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=42 KG/CM2 DE 18 CM DE ESPESOR Y CANASTILLA PASAJUNTAS TRANSVERSAL A BASE DE REDONDO LISO DE 1/2"), CARGA Y ACARREO, Y LIMPIEZA.

BENEFICIARIOS:

GAITZFER
GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.
R.F.C.: G0C110614TJ6
CARRETERA FEDERAL
TUXTEPEC PALOMARES, KM. 23
BETHANIA TUXTEPEC, OAXACA
TELEFONO: 287 108 34 42 C.P. 68447

300 HABITANTES
SINDICO HACENDARIO
Mpio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax 2022-2024

COMITE DE CONTROL
Mpio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax 2022-2024

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DE CAPUFE	\$ 3,451,247.21	\$ 3,441,609.13	\$ 3,441,609.13	\$ 3,441,609.13
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV				
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33				
APORTACION ESTATAL (especificar)				
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS				
OTROS (INGRESOS FISCALES)				
TOTAL	\$ 3,451,247.21	\$ 3,441,609.13	\$ 3,441,609.13	\$ 3,441,609.13

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 1,032,482.74 INCLUYE I.V.A.

TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
SALDO
CONTRATADO
EJERCIDO
INFRAESTRUCTURA
BÁSICA DE LA DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
Mpio. de San Juan
Bautista Tuxtpec,
Oax.
2022-2024

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	10896-00121-4	05/09/2024	\$1,032,482.74	ASEGURADORA INSURGENTES S.A DE C.V.
CUMPLIMIENTO	10896-00122-3	05/09/2024	\$344,160.91	ASEGURADORA INSURGENTES S.A DE C.V.
VICIOS OCULTOS	103319-01913-6	27/11/2024	\$344,160.91	ASEGURADORA INSURGENTES S.A DE C.V.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
1 (UNO)	09-sep-24	08-oct-24	\$1,193,899.81	\$ -	\$1,193,899.81	\$ 191,023.97	\$ 1,384,923.78	\$ 415,477.13	\$ 5,960.50	\$ 4,944.66	\$ 958,532.49
2 (DOS)	02-oct-24	07-nov-24	\$ 1,178,157.18	\$ -	\$1,178,157.18	\$ 188,505.15	\$ 1,366,662.33	\$ 409,998.70	\$ 5,890.79	\$ 4,829.54	\$ 945,893.30
3 (TRES FINIQUITO)	08-nov-24	22-nov-24	\$ 504,847.43	\$ -	\$504,847.43	\$ 95,175.59	\$ 600,023.02	\$ 207,006.91	\$ 2,974.24	\$ 2,463.73	\$ 477,578.14
TOTALES			\$2,866,904.42	\$0.00	\$2,866,904.42	\$474,704.71	\$3,341,609.13	\$1,032,482.74	\$14,834.53	\$12,287.93	\$2,302,003.93

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO. POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA, SE TIENE POR FINIQUITO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

MUNICIPAL
Mpio. de San Juan Bautista
Tuxtpec
Oax.
2022-2024

TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtpec,
Oax.
2022-2024

COMANDO EN JEFE
COMANDO EN JEFE
CONTROL
Mpio. de San Juan Bautista
Tuxtpec,
Oax.
2022-2024

GAITZFER
GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.
R.F.C.: GGE140614TJ6
CARRETERA FEDERAL
TUXTEPEC-PALOMARES, KM. 23
BETHANIA TUXTEPEC, OAXACA
TELEFONO: 267 108 34 42 C.P. 69447

TUXTEPEC
COMITE DE CONTRALORIA
Mpio. de San Juan Bautista
Tuxtpec,
Oax.
2022-2024

SINDICO HACENDARIO
Mpio. de San Juan Bautista
Tuxtpec,
Oax.
2022-2024

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL CONTRATISTA)

EMPRESA: GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.
ADMINISTRADOR UNICO: ING. FERNANDO UBIETA HERNANDEZ
R.F.C.: GGC110614TJ6
DOMICILIO: CARRETERA FEDERAL TUXTEPEC-PALOMARES KM 23 COL. CENTRO, LOC. BETHANIA, C.P. 68447, TEL: 01 287 108 3442


ING. FERNANDO UBIETA HERNANDEZ

ADMINISTRADOR UNICO



DR. EMILIO BRAVO GRAJALES

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF. No. 3641403



LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 2022-2024

ING. HUMBERTO AYBIDANG VELAZQUEZ

SUPERVISOR DE OBRA



ING. GERARDO GOMEZ CRUZ


SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA BASICA
CED. PROF. No. 3877418 D.R.O. : 6-22681

ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO

SINDICO HACENDARIO
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 2022-2024

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA MUNICIPAL

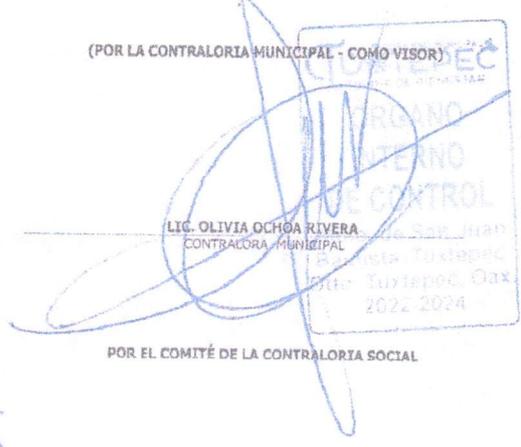

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
CONTRALOR SOCIAL



C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
CONTRALOR SOCIAL



C. SAUL SALUM ALLENDE
CONTRALOR SOCIAL

