

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 21 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. GRAJALES), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ING. LEOBARDO MORENO BRAVO., QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: ING. LEOBARDO MORENO BRAVO, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. LEONARDA GONZALEZ RAMON, C. ISMABEL REYES VIGIL, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAUL SALUM ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA COLONIA GRAJALES.



I.- UBICACIÓN

|            |   |            |                                  |
|------------|---|------------|----------------------------------|
| ESTADO:    | (020) OAXACA                                      | DISTRITO:  | (006) TUXTEPEC.                  |
| REGION:    | (005) PAPALOAPAN.                                 | MUNICIPIO: | (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC |
| LOCALIDAD: | (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. GRAJALES) |            |                                  |

II.- DATOS GENERALES

|                                      |   |                      |           |
|--------------------------------------|---|----------------------|-----------|
| ORIGEN DEL RECURSO:                  | RAMO 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024 |                      |           |
| RUBRO:                               | URBANIZACION (TECHADO)  | CUENTA PRESUPUESTAL: |           |
| OFICIO DE APROBACIÓN No.             | FAISMUN/MSJBT/20184/2024/051  | FECHA:               | 09-mar-24 |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN:              | INVITACIÓN RESTRINGIDA  | FECHA:               | 29-mar-24 |
| NUMERO DE CONTRATO:                  | MSJBT-20184-IR/FAISMUN-019/2024   | FECHA:               | 03-abr-24 |
| CONVENIO AL CONTRATO:                |   | FECHA:               | 03-abr-24 |
| FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:      | 03-abr-24   | INICIO REAL:         | 03-abr-24 |
| FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: | 16-jun-24   | TERMINACION REAL:    | 16-jun-24 |

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:  
PARA REALIZAR LA OBRA:  
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA COLONIA GRAJALES UBICADA EN (AREA DE CANCHAS) EN CALLE QUERETERO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. GRAJALES) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA ESTRUCTURAS DE OBRAS HIDRÁULICAS, CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA F'C= 250 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM, DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C= 150 KG/CM², RETIRO Y DESMANTELADO CON RECUPERACIÓN DE BASES PIRAMIDIALES DE CONCRETO PARA LUMINARIAS DE 60X60X70 CMS DE SECCIÓN, RETIRO DE POSTE CONICO DE METAL DE 7 MTS DE ALTURA (ALUMBRADO). CIMENTACION; EXCAVACION CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, AFINE EN FONDO DE CEPAS EN EXCAVACION PARA RECIBIR TUBERIA, CAMA DE ARENA O PLANTILLA, EN ESPESOR DE 1 A 5 CMS., CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM² DE 0.05 M. DE ESPESOR, ZAPATA AISLADA TIPO ZA-1 DE SECCION DE 1.80 X 1.80 X 0.25 MTS., CONCRETO F'C=250 KG/CM2, DADO D-1 DE SECCION 0.50 X 0.50 MTS., CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO. ESTRUCTURA DE CONCRETO Y ALBAÑILERIA; COLUMNA TIPO C-01 EN ESTRUCTURA DE SECCION 0.40 MTS DIAMETRO., CONCRETO F'C=250 KG/CM2, CONSTRUCCION DE PISO DE 10 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON EQUIPO MENOR Y RESISTENCIA NORMAL F'C= 150KG/CM². ESTRUCTURA DE ACERO; SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE PLACA LISA ACERO AL CARBON A-36 DE 35 CMS DIAMETRO, DE 3/4" DE ESPESOR, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ARMADURA A1 TIPO SÁNWICH A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL A.P.S DE 2 1/2"x3/16" X 4.57 KG/M, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ARMADURA SECUNDARIA A3 A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL P.T.R. 1 1/2 X CAL. 11, 3.15 KG/M, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONTEN DE 6"x2" CAL. 14, CON CLIP DE ANGULO DE 2 1/2"x3/16" DE 15 CMS DE LONGITUD, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAFLANBEO DE FIERRO REDONDO LISO DE 1/2" DE DIAMETRO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA HEXAGONAL EN LOS DOS EXTREMOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAVIENTO DE REDONDO LISO DE 3/4" (19MM) 2.22 KMM DE DIAMETRO. CUBIERTA; SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA DE LÁMINA ACANALADA TERNIUM R-101 EN ALEACION ZINC-ALUMINIO CALIBRE 26, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLETE GALVANIZADO TIPO R-101 CAL-26, FIJADO A LARGUEROS CON PIJA PUNTA-BROCA DE 25 MM X 1/4" DE DIAMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LÁMINA ZINTRO ALUM R-72 ACANALADA CAL. 32, PARA SISTEMA ATORNILLABLE ENTRE LÁMINAS. BAJADAS PLUVIALES; SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CANALÓN PLUVIAL EN LÁMINA LISA GALVANIZADA CAL. 20, DESARROLLO DE 72 CMS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE DE AGUA PLUVIAL CON 6.50 ML. DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO PESADO DE 4" DE DIAM., INSTALACIONES ELECTRICAS; CONSTRUCCION DE CASETA PARA LA BASE DE MEDICION DE 1.05X0.35 CMS DE SECCION CON ALTURA DE 1.90M, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO-2 MCA. SQUARE D O SIMILAR, CONSTRUCCION DE REGISTRO ELÉCTRICO CON SECCION DE 60 X 60 X 80 CMS MEDIDAS INTERIORES, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOSIDO DE 5X10X20 CMS DE SECCION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO E.Q.G.O. PARED GRUESA DE 3/4" PARA ALIMENTACION DE ELÉCTRICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELÉCTRICO PVC 4"x4", SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHALUPA DE ALUMINIO CAJA MOLDEADA TIPO CONDUIT 3 ORIFICIOS 1/2" Y 3/4" Y CONECTOR CONDUIT RECTO CON TORNILLO DE FIJACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO DE LA LINEA BTICINO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR DE 2 VÍAS DE LA LINEA BTICINO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 P. 15 AMP. SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA FISICA A BASE DE VARILLA COPPERWELD 5/8" X 1.50M, CON ABRAZADERA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL. 8 MCA IUSA PARA ALIMENTACION DE LUMINARIAS Y/O CONTACTOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL. 10 MCA IUSA PARA ALIMENTACION DE LUMINARIAS Y/O CONTACTOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR DE LEDS DE 150W, LUZ FRIA DE 6500K 30000 HRS DE VIDA. EQUIPAMIENTO Y ACABADOS; SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE PARA DELIMITACION DE AREAS DE JUEGO, EN FRANJAS DE 5 CMS DE ANCHO, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINÍLICA COMEX PRO 1000 O SIMILAR (PREVIA AUTORIZACION DE SUPERVISION) SOBRE COLUMNAS Y TRABES HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS., ROTULADO DE LOGOTIPO MUNICIPAL CON SECCION DE 1.20 X 2.00 MTS A BASE DE PINTURA VINÍLICA COMEX PRO 1000 O SIMILAR, TABLERO DE 1.80 X 1.20 M. ACRILICO DE 6 MM, CON ARO DE 45 CMS DE DIAMETRO, MANTENIMIENTO DE PORTERIA DE TUBO DE ACERO DE 3" DE DIAMETRO, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TOP DEPORTIVO EN PISO. JUEGOS INFANTILES Y MALLAS CICLONICA; TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTES DE ESTRUCTURAS DE OBRAS HIDRÁULICAS EN CAMINOS, EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, CONSTRUCCION DE GUARNICION DE SECCION TRAPEZOIDAL 15.00X20.00X70.00 CMS DE SECCION, CONCRETO F'C= 200KG/CM², SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLÓNICA CAL. 11.5" CON POSTES A CADA 3.00 MTS DE TUBO GALVANIZADO DE 2.78" (73 MM DIAM.), SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMBIO DE TRES ASIENTOS DE BANDA MARCA JUMBO-COL-AB-02-00, SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBE Y BAJA SENCILLO MARCA JUMBO-SUB-00-01-00, SUMINISTRO Y COLOCACION DE RESBALADILLA LÁMINA DE 3M RES-00-02-00, SUMINISTRO, COLOCACION Y DISTRIBUCION DE MATERIAL VOLCANICO, TEZONTLE ROJO, 8 CMS DE ESPESOR. BAJA TENCION; RETIRO DE POSTE DE CONCRETO DE DIFERENTES MEDIDAS Y PESOS, RETIRO DE CABLES CONDUCTORES EXISTENTE PARA SU SUSTITUCIONES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PC-13-600, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE MÚLTIPLE 3+1 CAL 3/0-1/0C ALUMINIO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRAJES COMO, ABRAZADERAS, AISLADORES, ADAPTADORES, LIMPIEZA, CARGAS Y ACARREO; CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBREPESADO FUERA DE LA OBRA, HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 5 KM, EN ZONAS SEMI URBANAS, (TERRACERÍAS), LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES. CONCEPTO EXTRAORDINARIO NO CONSIDERADO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS CONTRATADO; DESMANTELAMIENTO DE MALLA CICLÓNICA DE HASTA 2.00 M, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ALUBION) PARA RENIVELACION DE TERRENO. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, JUEGOS Y BANCA DE ACERO.

*[Handwritten signatures]*

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA**

**CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-019/2024**



**METAS ALCANZADAS:**

SE REALIZARON TRABAJOS EN UN ÁREA DE 29.00 X 15.50 MTS: EN PRELIMINARES (TRAZO, DEMOLICIÓN, CORTE CON DISCO, RETIRO Y COLOCACIÓN DE POSTE); EN CIMENTACIÓN (ZAPATAS AISLADAS, DADOS DE CONCRETO); EN ESTRUCTURA DE CONCRETO Y ALBAÑILERÍA (COLUMNAS, PISO DE 10 CM. DE ESPESOR, REGISTROS); EN ESTRUCTURA DE ACERO (PLACAS DE ACERO, ARMADURAS, LARGUEROS, CONTRAFLAMBEO); EN CUBIERTA (504.60 M2 DE LAMINA ACANALADA, CABALLETE); EN BAJADAS PLUVIALES (CANALÓN, BAJANTES); EN EQUIPAMIENTO Y ACABADOS (MANT. DE PORTERÍAS, TABLERO, PINTURA); EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA (ACOMETIDA, LÁMPARAS); 90.18 ML DE GUARNICIÓN DE 15X20X70 CMS. DE SECCIÓN, 225.46 M2 DE MALLA CICLÓNICA CON POSTES A CADA 3 MTS, 5 JUEGOS INFANTILES, CARGA Y ACARREO, LIMPIEZA GRAL DE LA OBRA.

**BENEFICIARIOS:**

1800 HABITANTES

**ESTRUCTURA FINANCIERA**


| PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS     | IMPORTE AUTORIZADO     | IMPORTE CONTRATADO     | IMPORTE DEVENGADO      | IMPORTE EJERCIDO       | SALDO CONTRATADO - EJERCIDO |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| APORTACION FEDERAL DEL FONDO III |                        |                        |                        |                        |                             |
| TRANSFERENCIA DEL FONDO IV       |                        |                        |                        |                        |                             |
| TRANSFERENCIA DEL RAMO 33        | \$ 2,686,220.89        | \$ 2,680,120.11        | \$ 2,680,120.11        | \$ 2,680,120.11        |                             |
| APORTACION ESTATAL (especificar) |                        |                        |                        |                        |                             |
| APORTACION DE LOS BENEFICIAIOS   |                        |                        |                        |                        |                             |
| OTRO S (INGRESOS FISCALES)       |                        |                        |                        |                        | \$ -                        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$ 2,686,220.89</b> | <b>\$ 2,680,120.11</b> | <b>\$ 2,680,120.11</b> | <b>\$ 2,680,120.11</b> | <b>\$ -</b>                 |

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 %

\$

804,036.03

INCLUYE I.V.A.



**III.- RELACION DE LAS GARANTIAS**

| FIANZAS        | NUMERO       | FECHA      | IMPORTE      | COMPañIA AFIANZADORA             |
|----------------|--------------|------------|--------------|----------------------------------|
| ANTICIPO       | 3557-05813-5 | 29/03/2024 | \$804,036.03 | ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. |
| CUMPLIMIENTO   | 3557-05814-6 | 29/03/2024 | \$268,012.00 | ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. |
| VICIOS OCULTOS | 3557-05982-2 | 21/06/2024 | \$268,012.01 | ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. |



**IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS**

| ESTIMACION          | PERIODO    |            | IMPORTE DE ESTIMACION | SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS |               | SUBTOTAL 1            | IVA 16.00 %         | MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION | AMORTIZACION DEL ANTICIPO | IMPUESTO ESTATAL 5 % AL MILLAR | IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA) | TOTAL PAGADO          |
|---------------------|------------|------------|-----------------------|--|---------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
|                     | DEL        | AL         |                       |  |               |                       |                     |                              |                           |                                |                                    |                       |
| 01 (UNO)            | 03/04/2024 | 02/05/2024 | \$1,138,462.55        | \$ -   | \$ -          | \$1,138,462.55        | \$ 182,154.01       | \$ 1,320,616.56              | \$ 396,184.97             | \$ 5,692.31                    | \$ 4,368.21                        | \$ 914,371.07         |
| 02 (DOS)            | 03/05/2024 | 31/05/2024 | \$713,317.23          | \$ -   | \$ -          | \$713,317.23          | \$ 114,130.76       | \$ 827,447.99                | \$ 248,234.40             | \$ 3,566.59                    | \$ 2,736.89                        | \$ 572,910.11         |
| 03 (TRES FINIQUITO) | 01/06/2024 | 16/06/2024 | \$458,668.59          | \$ -   | \$ -          | \$458,668.59          | \$ 73,386.97        | \$ 532,055.56                | \$ 159,616.66             | \$ 2,293.34                    | \$ 1,759.88                        | \$ 368,385.68         |
| <b>TOTALES</b>      |            |            | <b>\$2,310,448.37</b> | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,310,448.37</b> | <b>\$369,671.74</b> | <b>\$2,680,120.11</b>        | <b>\$804,036.03</b>       | <b>\$11,552.24</b>             | <b>\$8,864.98</b>                  | <b>\$1,855,666.86</b> |

Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.

*[Handwritten signatures]*

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA**

**CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-019/2024**

**V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.


UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

**ENTREGA LA OBRA:**  
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

  
 LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 2022-2024

  
 ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO  
 SINDICO HACENDARIO  
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 2022-2024

  
 DR. EMILIO BRAVO GRAJALES  
 DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO  
 CED. PROF. No. 3641403

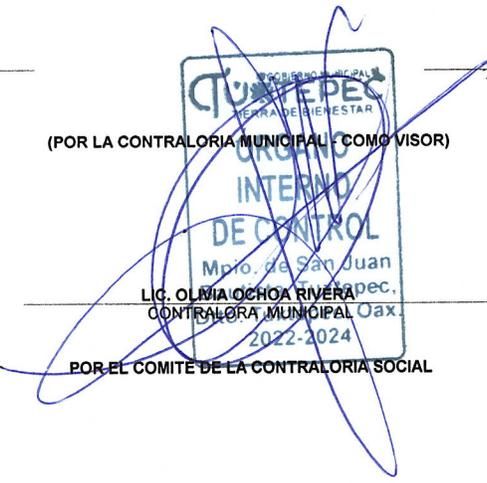
  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 2022-2024

**RECIBE LA OBRA**  
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)

  
 C. LEONARDA GONZALEZ RAMON  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

  
 C. ISABEL REYES VIGIL  
 SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL COMO VISOR)

  
 LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA  
 CONTRALORA MUNICIPAL  
 Oax. 2022-2024

(POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL)

  
 C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ  
 CONTRALOR SOCIAL

  
 C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ  
 CONTRALOR SOCIAL

  
 C. SAUL SALUM ALLENDE  
 CONTRALOR SOCIAL

  
 COMITE DE CONTROL INTERNO  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 2022-2024

  
 COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
