

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 26 DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. 5 DE MAYO), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIONES DARYSA S.A. DE C.V., QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: C. ROSA ISELA LUNA CELAYA, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. SABINA CENTENO RAMIREZ, C. ROSELIA GARCIA MONTOR, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA , C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAÚL SALUM ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES EN LA COLONIA 5 DE MAYO.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA
REGION: (005) PAPALOAPAN.
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. 5 DE MAYO)

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024

RUBRO: URBANICACION (PUENTE)
OFICIO DE APROBACIÓN No. FAISMUN/MSJBT/20184/2024/067

CUENTA PRESUPUESTAL: 20-mar-24
FECHA: 20-mar-24

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS

NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-034/2024
FECHA: 29-abr-24

CONVENIO AL CONTRATO: CONVENIO No. 001/2024 AL CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-034/2024
FECHA: 12/06/2024

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 06-may-24
INICIO REAL: 06-may-24

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: 19-jul-24
TERMINACION REAL: 19-jul-24

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:
PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES EN LA COLONIA 5 DE MAYO UBICADA EN LA PRIVADA DE LAS PALMAS, CALLE GABILONDO SOLER CRI-CRI DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. 5 DE MAYO) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

CONSTRUCCION DE PASOS VEHICULARES EN LA PRIVADA DE LAS PALMAS, PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTES DE ESTRUCTURAS DE OBRAS HIDRÁULICAS EN CAMINOS, CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C=250 KG/CM² A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM, DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA PESADA DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C=250 KG/CM², EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA PESADA EN AGUA Y MATERIAL SATURADO DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD. OBRA DE DESVIO Y COMPLEMENTARIA; CORTE EN MATERIAL TIPO II PARA LA CONFORMACIÓN DE CAJA DEL CANAL, TRABAJOS REALIZADOS EN MATERIAL SATURADO Y CON SUMINISTRO SUPERFICIAL, OBRA PROVISIONAL (ATAGÜIA) DE PROTECCIÓN A BASE DE COSTALES RELLENO DE GRAVA EN GREÑA, ANCHO DE HASTA 4.50M Y HASTA 2.00 MTS DE ALTURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC ALICANTARILLADO SERIE 20 DE 0.30 MTS DE DIÁMETRO (12"Ø), CON RECUPERACIÓN. CIMENTACIÓN; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PEDRAPLÉN, CON PIEDRA BOLA CRIBADA DE 4" MÁXIMO, CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM² DE 0.05 M. DE ESPESOR, CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN DE SECCIÓN 3.37M DE ANCHO, 1.00 ALTURA Y 30CM DE ESPESOR, ARMADO A BASE DE DOBLE PARRILLA DE VARILLA DE 3/8" A CADA 15CM DE ESPESOR, CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO CON RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM², CON T.M.A., DE 3/4" Y DE 25.00 CMS DE ESPESOR. ESTRUCTURA DE CONCRETO; CONSTRUCCIÓN MUROS LATERALES M-1 DE CONCRETO CON RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM², CON T.M.A., DE 3/4" Y DE 25.00 CMS DE ESPESOR, CONSTRUCCIÓN ALERO A-1 DE CONCRETO CON RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM², CON T.M.A., DE 3/4" Y DE 25.00 CMS DE ESPESOR, CONSTRUCCIÓN LOSA DE RODAMEINTO DE CONCRETO CON RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM², CON T.M.A., DE 3/4" Y DE 20.00 CMS DE ESPESOR, RELLENOS; RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR Y MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARCILLA). HERRERIA; CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE BARANDAL DE HERRERÍA DE 1.10 MTS DE ALTURA A BASE DE TUBO DE FIERRO NEGRO DE 2" DE DIÁMETRO CED. 30 CAL. 12. REPARACION DE AFECTACIONES; CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES EN MATERIAL DE TIPO II, SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTÁNDAR) CON EQUIPO MENOR DE MATERIAL LIMPIO DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCIÓN 50-50, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM², CON T.M.A. DE 3/4 - 1/2", DE 0.15 MTS, CORTE CON DISCO EN CONCRETO HIDRÁULICO AL 2DO O 3ER. DÍA DE COLADO A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15.00X20.00X40.00 CMS DE SECCIÓN, CONCRETO F'C= 200KG/CM², CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA A BASE DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM², CON T.M.A. DE 3/4", DE 0.10 MTS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO. LIMPIEZA CARGAS Y ACARREOS DE MATERIALES SOBANTES FUERA DE LA OBRA, HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 5 KM, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES. CONSTRUCCIÓN DE PASOS VEHICULAR EN LA CALLE GABILONDO SOLER CRI CRI, PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTES DE ESTRUCTURAS DE OBRAS HIDRÁULICAS, CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C=250 KG/CM² A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM, DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA PESADA DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C=250 KG/CM², EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA PESADA EN AGUA Y MATERIAL SATURADO DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD. OBRA DE DESVIO Y COMPLEMENTARIA; CORTE EN MATERIAL TIPO II PARA LA CONFORMACIÓN DE CAJA DEL CANAL, OBRA PROVISIONAL (ATAGÜIA) DE PROTECCIÓN A BASE DE COSTALES RELLENO DE GRAVA EN GREÑA, ANCHO DE HASTA 4.50M Y HASTA 2.00 MTS DE ALTURA, INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC ALICANTARILLADO SERIE 20 DE 0.30 MTS DE DIÁMETRO (12"Ø), (RECUPERADO). CIMENTACIÓN; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PEDRAPLÉN, CON PIEDRA BOLA CRIBADA DE 4" MÁXIMO, CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM² DE 0.05 M. DE ESPESOR, CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO CON RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM², CON T.M.A., DE 3/4" Y DE 25.00 CMS DE ESPESOR, CONSTRUCCIÓN LOSA DE RODAMEINTO DE CONCRETO CON RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM², CON T.M.A., DE 3/4" Y DE 25.00 CMS DE ESPESOR, CONSTRUCCIÓN LOSA DE RODAMEINTO DE CONCRETO CON RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM², CON T.M.A., DE 3/4" Y DE 25.00 CMS DE ESPESOR, RELLENOS; RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO. HERRERIA; CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE BARANDAL DE HERRERÍA DE 1.10 MTS DE ALTURA A BASE DE TUBO DE FIERRO NEGRO DE 2". REPARACION DE AFECTACIONES; CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES EN MATERIAL DE TIPO II, SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTÁNDAR) CON EQUIPO MENOR DE MATERIAL LIMPIO DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCIÓN 50-50, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM², CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15.00X20.00X40.00 CMS DE SECCIÓN, CONCRETO F'C= 200KG/CM², CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA A BASE DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM², SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO. LIMPIEZA CARGAS Y ACARREOS; CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBANTES FUERA DE LA OBRA, HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 5 KM, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES. DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA PESADA DE MURO EXISTENTE A BASE DE PIEDRA MAMPOSTEADA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA GALVANIZADA DE 2 1/2" DE DIAM, CED.40, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO GALVANIZADO DE 2 1/2" X 45, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTAS YUGO DE 2 1/2", DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA DE LOSA DE CONCRETO ARMADO CON RESISTENCIA DE HASTA F'C=250 KG/CM², DEMOLICIÓN MANUAL DE BANQUETA CON CONCRETO ARMADO CON RESISTENCIA DE HASTA F'C=150 KG/CM².

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-034/2024

CONVENIO No. 001/2024 AL CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-034/2024

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARAN TRABAJOS DE: EN PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE CON DISCO, DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN); OBRAS DE DESVÍO Y COMPLEMENTARIAS: EN CIMENTACIÓN (45.88 M3 DE PEDRAPLÉN CON PIEDRA BOLA, PLANTILLA, DENTELLÓN, 57.84 M2 DE LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO DE 25 CM. DE ESPESOR F'C=250 KG/CM²); EN ESTRUCTURA DE CONCRETO (49.74 M2 DE MUROS LATERALES M-1 DE CONCRETO ARMADO F'C=250 KG/CM² Y 8.63 M2 DE ALERO A-1 DE CONCRETO ARMADO F'C=250 KG/CM² DE 25.00 CMS DE ESPESOR, 69.89 M2 DE LOSA DE RODAMIENTO DE CONCRETO ARMADO F'C=250 KG/CM² DE 20.00 CMS DE ESPESOR); RELLENOS (ARCILLA); 32.55 M3 DE BASE HIDRÁULICA, 198.83 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM² DE 0.15 MTS., 23.20 ML GUARNICIÓN DE 15.00X20.00X40.00 CMS DE SECCIÓN F'C= 200KG/CM², 28.29 M2 DE BANQUETA F'C=150 KG/CM² DE 0.10 MTS. DE ESPESOR, CARGA Y ACARREO, Y LIMPIEZA.

8.63

300 HABITANTES

ÓRGANO
INTERNO
DE CONTROL
Mpio. de San Juan
Bautista, Tuxtepec,
Oax. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

ESTRUCTURA FINANCIERA

PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,284,572.77	\$ 1,278,293.41	\$ 1,401,220.26	\$ 1,401,220.26	-\$ 122,926.85
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	\$ 1,284,572.77	\$ 1,278,293.41	\$ 1,401,220.26	\$ 1,401,220.26	-\$ 122,926.85

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 %

\$

383,488.02

INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPañIA AFIANZADORA
ANTICIPO	24A24271	29/04/2024	\$383,488.02	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.
CUMPLIMIENTO	24A24275	29/04/2024	\$127,829.34	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.
ENDOSO CUMPLIMIENTO	24A24276	12/06/2024	\$12,292.69	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.
VICIOS OCULTOS	0032400099203	26/07/2024	\$140,122.03	MAPRE FIANZAS S.A.

COLONIA
05 DE MAYO

RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
1 (UNO)	06/05/2024 - 20/05/2024	\$462,143.79	\$ -	\$462,143.79	\$ 73,943.01	\$ 536,086.80	\$ 160,826.04	\$ 2,310.72	\$ 2,206.33	\$ 370,743.71
2 (DOS)	30/05/2024 - 26/06/2024	\$419,582.15	\$ -	\$419,582.15	\$ 67,133.14	\$ 486,715.29	\$ 146,014.59	\$ 2,097.91	\$ 2,002.74	\$ 336,600.05
3 (TRES)	27/06/2024 - 05/07/2024	\$220,251.14	\$ -	\$220,251.14	\$ 35,240.18	\$ 255,491.32	\$ 76,647.39	\$ 1,101.26	\$ 1,051.61	\$ 176,691.06
04 (CUATRO FINIQUITO)	10/05/2024 - 19/07/2024	\$105,971.42	\$ -	\$105,971.42	\$ 16,955.43	\$ 122,926.85		\$ 529.86	\$ 400.24	\$ 121,996.75
TOTALES		\$1,207,948.50	\$0.00	\$1,207,948.50	\$193,271.76	\$1,401,220.26	\$383,488.02	\$6,039.75	\$5,660.92	\$1,006,031.57

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-034/2024

CONVENIO No. 001/2024 AL CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-034/2024

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

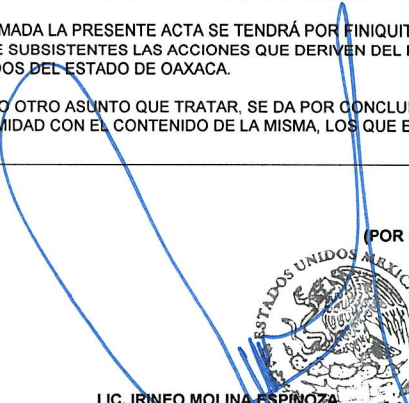
UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.


UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.


ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)


LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL


PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista
Tuxtepec
Oax.
2022-2024


DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF. No. 3641403


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec,
Oax.
2022-2024



ING. ROGELIO GOMEZ CASTILERO
SINDICO HACENDARIO
Oax.
2022-2024

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)



C. SABINA CENTENO RAMIREZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ



C. ROSELIA GARCIA MONTOR
SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)


LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA MUNICIPAL

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL


C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
CONTRALOR SOCIAL


C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
CONTRALOR SOCIAL


C. SAUL SALUM ALLENDE
CONTRALOR SOCIAL


COMITÉ VECINAL
COLONIA
05 DE MAYO
2022-2024
SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC, OAXACA
