

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 08 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SEBASTOPOL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA C. MARIA ANTONIA VILLANUEVA SANCHEZ, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: C. MARIA ANTONIA VILLANUEVA SANCHEZ, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. CAYETANO MALDONADO GONZALEZ, C. DELFINA MENDEZ MOGUEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAÚL SALUM ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SEBASTOPOL.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA
REGION: (005) PAPALOAPAN.
LOCALIDAD: (0085) SEBASTOPOL

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024

RUBRO:	URBANIZACION	CUENTA PRESUPUESTAL:	
OFICIO DE APROBACIÓN No.	FAISMUN/MSJBT/20184/2024/078	FECHA:	15-abr-24
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS		
NUMERO DE CONTRATO:	MSJBT-20184-IR/FAISMUN-045/2024	FECHA:	16-may-24
CONVENIO AL CONTRATO:		FECHA:	
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	20-may-24	INICIO REAL:	20-may-24
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	02-ago-24	TERMINACION REAL:	02-ago-24

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SEBASTOPOL UBICADA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE SEBASTOPOL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:



PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA ANDADORES, BANQUETAS, DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C= 200 KG/CM2. TALA DE ÁRBOL DE 10-30 CM Ø, HASTA 5.00 M DE ALTURA, EXCAVACIÓN EN CEPAL CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EXCAVACIÓN EN CEPAL CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO II DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD, EXCAVACIÓN EN CEPAL CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO II DE 4.01 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE OBRAS PROVISIONALES PARA SOSTENER POSTES ELÉCTRICOS. MURO DE CONTENCIÓN; CONSTRUCCIÓN DE PEDRAPLEN A BASE DE GRAVA Y PIEDRA BOLA HASTA 5" EN PROPORCIÓN DE 50-50. CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR A BASE CONCRETO SIMPLE F'C= 100 KG/CM2. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO (60-40) CON PIEDRA BOLA LIMPIA Y CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2 CON T.M.A DE 3/4" Ø, R.N., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA DE GRANULOMETRIA MAYOR A 1" Ø Y PIEDRA BOLA DE 2" - 4" EN PROPORCIÓN DE 50-50. RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARCILLA). DRENAJE PLUVIAL; TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ESTRUCTURAS DE OBRAS HIDRÁULICAS EN CAMINOS; COMO, REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y PLUVIALES, ALCANTARILLAS, VADOS, TANQUES Y PUENTES, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS CON EQUIPO TOPOGRÁFICO. EXCAVACIÓN EN CEPAL CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EXCAVACIÓN EN CEPAL CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO II DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD, AFINE DE FONDO DE CEPAL EN EXCAVACIÓN PARA RECIBIR TUBERÍA, HASTA 5 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, COMPACTADA POR MEDIOS MANUALES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 105 CM (42") Ø, PRUEBA DE ESCURRIMIENTO EN LA RED DE DRENAJE YA SEA PLUVIAL O SANITARIO, ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON PRODUCTO DE BANCO (GRAVA EN GREÑA CON T.M.A. DE 1" Ø) EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO. LIMPIEZA, CARGAS Y ACARREOS; CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 5 KM A TIRO LIBRE, LIMPIEZA GENERAL.

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARON TRABAJOS DE PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN DE 0.00-2.00, 2.01-4.00 Y DE 4.01-6.00 MTS DE PROFUNDIDAD); EN MURO DE CONTENCIÓN (82.04 M3 DE PEDRAPLEN, 220.28 M3 DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO (60-40) CON PIEDRA BOLA LIMPIA Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 21.94 M3 DE FILTRO DE GRAVA, 152.95 M3 DE RELLENO (ARCILLA); EN DRENAJE PLUVIAL (12.00 ML DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 105 CM (42") Ø); CARGA Y ACARREO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

BENEFICIARIOS:


200 HABITANTES



Handwritten signature and date 2022-2024.

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-045/2024



ESTRUCTURA FINANCIERA					
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,472,424.35	\$ 1,468,694.50	\$ 1,468,694.50	\$ 1,468,694.50	-\$ 0.00
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	\$ 1,472,424.35	\$ 1,468,694.50	\$ 1,468,694.50	\$ 1,468,694.50	-\$ 0.00

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 440,608.35 INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	10825-00379-5	16/05/2024	\$440,608.35	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	10825-00380-3	16/05/2024	\$146,869.45	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	10825-00536-0	08/08/2024	\$146,869.45	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL										
01 (UNO)	20/05/2024	18/06/2024	\$760,791.40	\$ -	\$ -	\$760,791.40	\$ 121,726.62	\$ 882,518.02	\$ 264,755.41	\$ 3,803.96	\$ 3,312.42	\$ 610,646.23
02 (DOS)	19/06/2024	18/07/2024	\$277,242.07	\$ -	\$ -	\$277,242.07	\$ 44,358.73	\$ 321,600.80	\$ 96,480.24	\$ 1,386.21	\$ 1,207.42	\$ 222,526.93
03 (TRES FINIQUITO)	19/07/2024	02/08/2024	\$228,082.48	\$ -	\$ -	\$228,082.48	\$ 36,493.20	\$ 264,575.68	\$ 79,372.70	\$ 1,140.41	\$ 993.51	\$ 183,069.06
TOTALES			\$1,266,115.95	\$0.00	\$0.00	\$1,266,115.95	\$202,578.55	\$1,468,694.50	\$440,608.35	\$6,330.58	\$6,513.35	\$1,016,242.22

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista
Tuxtepec
Otto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

SINDICO HACENDARIO
Mpio. San Juan Bautista
Tuxtepec,
Otto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec,
Otto Tuxtepec Oax.
2022-2024

COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
Otto. Tuxtepec, Oax.

[Firma]

[Firma]

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-045/2024

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

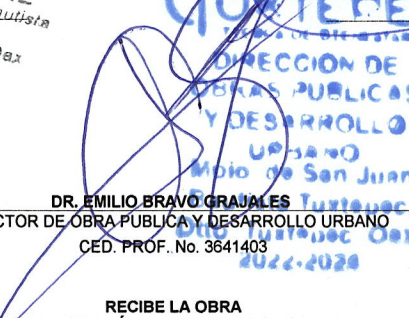
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)



LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista
Tuxtepec
Oax. Tuxtepec, Oax.
2022-2024


ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
SINDICO HACENDARIO
Mpio. San Juan Bautista
Tuxtepec,
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024


DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF. No. 3641403

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)



C. CAYETANO MALDONADO GONZALEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ


C. DELFINA MENDEZ MOGUEL
SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)


LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA MUNICIPAL

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL


C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
CONTRALOR SOCIAL


C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
CONTRALOR SOCIAL


C. SAUL SALUM ALLENDE
CONTRALOR SOCIAL

