

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-AD/FAISMUN-060/2024

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 06 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY A20DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA C. CESAR REYES TINOCO, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: C. CESAR REYES TINOCO, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. EFRAIN ROJAS SANCHEZ, C. JUVENAL LLANO FLORES PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAÚL SALUM ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: COSNTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA NUEVA FLORENCIA.


I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA ✓ DISTRITO: (006) TUXTEPEC. ✓
 REGION: (005) PAPALOAPAN. ✓ MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ✓
 LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. NUEVA FLORENCIA) ✓

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024

RUBRO: URBANIZACION ✓ CUENTA PRESUPUESTAL: ✓
 OFICIO DE APROBACIÓN No. FAISMUN/MSJBT/20184/2024/089 ✓ FECHA: 20-jun-24 ✓
 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACION DIRECTA ✓ FECHA: 01-jul-24 ✓
 NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-060/2024 ✓ FECHA: ✓
 CONVENIO AL CONTRATO: ✓ FECHA: ✓
 FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 04-jul-24 ✓ INICIO REAL: 04-jul-24 ✓
 FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 01-sep-24 ✓ TERMINACION REAL: 01-sep-24 ✓
 DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS: ✓



PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA NUEVA FLORENCIA UBICADA EN LA CALLE NOGALES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ABUTISTA TUXTEPEC (COL. NUEVA FLORENCIA) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.



DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ANDADORES, BARRIJAS, DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA FC= 200 KG/CM2. TERRACERIAS; CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDIENDO EL MATERIAL PARA ALDAR SUBRASANTE Y ADICIONALES EN MATERIAL TIPO II, RECOMPACTACIÓN CON MÁQUINARIA AL 90% DE PROCTOR ESTÁNDAR DE LA SUPERFICIES EXPUESTAS POR EL CORTE Y SUCIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTÁNDAR) CON MÁQUINARIA DE MATERIAL DE BANCO GRAVA ARCILLA EN PROPORCIÓN 50:50. GUARNICIONES; EXCAVACIÓN MANUAL EN CEPA, MATERIAL TIPO II SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICION TRAPEZOIDAL A BASE DE CONCRETO SIMPLE FC= 200 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Ø, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO TRÁFICO MARCA COMEX O SIMILAR. PAVIMENTO; RENOVELACIÓN DE POZO DE VISTA EXISTENTE HASTA 40 CM DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MURO DE TABICÓN DE CONCRETO SIMPLE JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL, BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO FC= 250 KG/CM2.CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA FC= 250 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM, SELLO DE JUNTAS DE CORTES EN CONCRETO HIDRÁULICO CON 5 CMS DE PROFUNDIDAD Y HASTA 1 CMS DE ANCHO, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO; CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 5 KM A TIRO LIBRE, INCLUYE CARGA A MÁQUINA, LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGAR LA OBRA.

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARÁN TRABAJOS DE: EN PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN); EN TERRACERÍAS (CORTES, RECOMPACTACIÓN, BASE HIDRÁULICA); 819.77 M2 CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=250 KG/CM2 DE 0.15 MTS DE ESPESOR, 384.36 ML DE GUARNICIÓN DE 15X20X40 MTS. DE SECCIÓN FC= 200 KG/CM²; CARGA Y ACARREO, Y LIMPIEZA.

BENEFICIARIOS: 300 HABITANTES

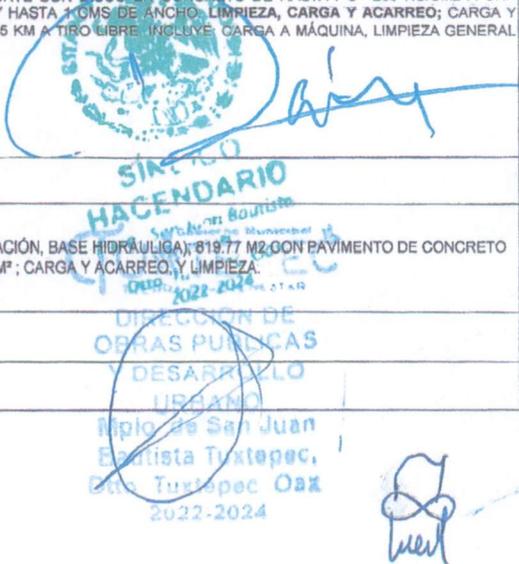

Signature

Signature

632



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-AD/FAISMUN-060/2024

ESTRUCTURA FINANCIERA						
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO	
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III						
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV						
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,172,705.42	\$ 1,168,095.00	\$ 1,168,095.00	\$ 1,168,095.00	\$	-
APORTACION ESTATAL (especificar)						
APORTACION DE LOS BENEFICARIOS						
OTROS (INGRESOS FISCALES)						
TOTAL	\$ 1,172,705.42	\$ 1,168,095.00	\$ 1,168,095.00	\$ 1,168,095.00	\$	-

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 350,428.50 INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	4909-03358-9	01/07/2024	\$350,428.50	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V
CUMPLIMIENTO	4909-03359-2	01/07/2024	\$116,809.50	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V
VICIOS OCULTOS	4909-03573-0	06/09/2024	\$116,809.50	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V

SINDICO HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista
 Tuxtepec, Oax.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO	
	DEL	AL									
01 (UNO)	04/07/2024	03/08/2024	\$800,331.58	\$ -	\$800,331.58	\$ 128,053.05	\$ 928,384.63	\$ 278,515.39	\$ 4,001.66	\$ 2,407.85	\$ 643,459.73
02 (DOS FINIQUITO)	04/08/2024	01/09/2024	\$206,646.87	\$ -	\$206,646.87	\$ 33,063.50	\$ 239,710.37	\$ 71,913.11	\$ 1,033.23	\$ 621.65	\$ 166,142.38
TOTALES			\$1,006,978.45	\$0.00	\$1,006,978.45	\$161,116.55	\$1,168,095.00	\$350,428.50	\$5,034.89	\$3,029.50	\$809,602.11

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Bautista
 Tuxtepec
 Dtto. Tuxtepec, Oax
 2022 - 2024

COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
 Dtto. Tuxtepec, Oax.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec,
 Dtto. Tuxtepec Oax
 2022-2024

ORGANO INTERNO DE CONTROL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
 Dtto. Tuxtepec Oax
 2022-2024

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-AD/FAISMUN-060/2024

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN L ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
 SINDICO HACENDARIO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax 2022-2024

Gobierno Municipal
TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Mpio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca
 CED. PROF. No. 3841403

HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 2022-2024
 COMITÉ VECINAL
 COLONIA NUEVA FLORENSA
 2022-2024
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAX.

RECIBE LA OBRA
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)

C. EFRAIN ROJAS SANCHEZ
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. JUVENAL LLANO FLORES
 SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
 CONTRALORA MUNICIPAL

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

Gobierno Municipal
TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
 COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
 CONTRALOR SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
 CONTRALOR SOCIAL

C. SAUL SALUM ALLENDE
 CONTRALOR SOCIAL
