

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 06 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY A20 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: C. DOMINGA BAUTISTA ZARRABAL, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: C. DOMINGA BAUTISTA ZARRABAL, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. BENJAMIN OLIVERA RAMIREZ, C. ANGEL RUEDA LOPEZ, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAÚL SALUM ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA ✓
REGION: (005) PAPALOAPAN ✓
LOCALIDAD: (0170) LAS DELICIAS ✓

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO:

RENDIMIENTOS FINANCIERO DE LA CUENTA DE RAMO 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024

RUBRO:

URBANIZACION (PARQUE) ✓

CUENTA PRESUPUESTAL:

OFICIO DE APROBACIÓN No.

FAISMUN/MSJBT/20184/2024/138 ✓

FECHA:

05-ago-24

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

INVITACION RESTRINGIDA ✓

FECHA:

28-sep-24

NUMERO DE CONTRATO:

MSJBT-20184-IR/RF-FAISMUN-096/2024 ✓

FECHA:

02-oct-24

CONVENIO AL CONTRATO:

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:

02-oct-24 ✓

INICIO REAL:

01-dic-24

FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:


DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS UBICADA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO: PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTES DE ESTRUCTURAS DE OBRAS HIDRÁULICAS EN CAMINOS COMO, REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y PLUVIALES, ALCANTARILLAS, VADOS, TANQUES Y PUENTES, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS CON EQUIPO TOPOGRÁFICOS, EN ÁREAS MAYORES A 1,000 M² HASTA 2,500 M², CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTES DE BANCOS DE PROYECTO, EN LA CAPA SUBYACENTE COMPACTADO AL 95 % DE SU PVSM CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MANUALES, ALBAÑILERÍA; CONSTRUCCIÓN DE CADENA DE DESPLANTE CD-01 A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON EQUIPO MENOR DE RESISTENCIA NORMAL F'c=200 KG/CM2 T.M.A. DE 3/4", CON SECCIÓN DE 15X28CM, ACERO DE REFUERZO ARMEX 15X20-4 SEGÚN ESPECIFICACIONES, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 28CM CON TABICÓN DE LA REGIÓN 10X14X28, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, JUNTA NO MENOR DE 1.00 CMS, CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO K A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON EQUIPO MENOR DE RESISTENCIA NORMAL F'c = 200 KG/CM2 T.M.A. DE 3/4", CON SECCIÓN DE 15X28 CM DE SECCIÓN, ACERO DE REFUERZO ARMEX 15X20-4 SEGÚN ESPECIFICACIONES, CONSTRUCCIÓN DE REPISÓN DE 8 CMS DE ESPESOR CABADO PULIDO A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE RESISTENCIA NORMAL F'c = 200 KG/CM2, CON T.M.A. DE 3/4", ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" DIAM, @ 0.20 MTS EN AMBOS SENTIDOS, CONSTRUCCIÓN DE GUARNIQUÍN DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15.00X20.00X40.00 CMS DE SECCIÓN, CONCRETO F'c= 200KG/CM², CONSTRUCCIÓN DE PISO DE 10 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON EQUIPO MENOR Y RESISTENCIA NORMAL F'c= 150KG/CM², CON T.M.A. DE 3/4", ACABADO RAYADO FINO EN SENTIDO DE LA PENDIENTE, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE 10 CMS DE ESPESOR, CONCRETO F'c=150 KG/CM², AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM, ACABADO ESTAMPADO CON COLORANTE ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, BARNIZ SELLADOR BRILLANTE, ACABADOS; APLANADOS EN MUROS Y PLAFÓN ACABADO FINO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 DE NO MENOS 2.00 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA COMEX PRO 1000 O SIMILAR (PREVIA AUTORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN) SOBRE MUROS Y PLAFONES, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE COMEX TOP 5 AÑOS, O SIMILAR, RELLENOS Y JARDINERÍA; RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR Y MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARCILLA), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAPA DE TIERRA FERTILIZADA PARA SIEMBRA DE PASTO DE 10 CM PROMEDIO DE ESPESOR EN CAMPO DE FUT BOL Y CABECERAS, PASTO ALFOMBRA EN ROLLO, CON TIERRA, SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBOL NEEEM CON ALTURA DE 1.25 HASTA 1.50 M, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL VOLCANICO, TEZONTLE ROJO, 8 CMS DE ESPESOR, EN TROTAPISTA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA DE 10CMS, DE ESPESOR, COMPACTADA POR MEDIOS MANUALES, EQUIPAMIENTO; SUMINISTRO E INSTALACION DE EJERCITADOR POTRO BALANCE DOBLE (EJE-BA-06-01) MARCA JUMBO O SIMILAR, FABRICADO CON TUBOS DE ACERO AL CARBON CED. 30, MEDIDAS 185X115CM, SUMINISTRO E INSTALACION DE EJERCITADOR ABDOMINALES BALANCE DOBLE (AEF-0212) MARCA JUMBO O SIMILAR, FABRICADO CON TUBOS DE ACERO AL CARBON CED. 30, MEDIDAS 200X120X105 CM., SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EJERCITADOR MOVIMIENTO DE CADERA (EJE-BA-03-01), MARCA JUMBO O SIMILAR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORRE DE JUEGOS EXTREMOS, MODELO MÓDULO GRADY (EOS-112 10.0), SUMINISTRO E INSTALACION DE CUMPLIMIENTO DE BANDA MARCA JUMBO-COL-AB-02-00, SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBE Y BAJA TRIPLE MARCA JUMBO SB-5-1, SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS RECT DE 2X3 MTS, MARCA JUMBO-PAS-00-03-00, ALUMBRADO; EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MANUALES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO DE 0.35 * 0.50 * 0.60 M, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO PARA ALUMBRADO CON TAPA Y MARCO PINTADO, DE CONCRETO DE 33 X 33 X 40CM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERÍA PVC CONDUITO PESADO DE 1 1/2" DE DIÁMETRO SUBTERRÁNEA PARA ALIMENTACION DE ELÉCTRICA EN AULAS, SUMINISTRO E INSTALACION CABLE AL XLP-URD 2+1 CAL. 4-4, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL. 12 MCA IUSA PARA ALIMENTACION DE LUMINARIAS Y/O CONTACTOS, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SUMINISTRO, MONTAJE, Y FIJACION DE POSTE CONICO DE 1 FAROL ALTURA DE 2.40M TERMINADO NEGRO, MAMPARA ELÉCTRICA; EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MANUALES, CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'c=100 KG/CM² DE 0.05 M. DE ESPESOR, CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA, CORRIDA DE 50 CM DE ANCHO POR 15CM DE ESPESOR A BASE CONCRETO HECHO EN OBRAS CON EQUIPO MENOR O A MANO RESISTENCIA NORMAL F'c = 250 KG/CM2, CON T.M.A. DE 3/4", ARMADA CON ACERO DE 3/8" DE DIÁMETRO CON SEPARACIÓN DE 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONSTRUCCIÓN DE CADENA DE DESPLANTE A BASE DE CONCRETO RESISTENCIA NORMAL F'c=250 KG/CM², CON T.M.A. DE 3/4", DE SECCIÓN 15X20 CMS, ARMADA CON ARMEX 15X20-4 REFORZADO CON 2 VARILLAS DEL NO. 3, CONSTRUCCIÓN DE PISO DE 8 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON EQUIPO MENOR Y RESISTENCIA NORMAL F'c= 150KG/CM², CON T.M.A. DE 3/4", ACABADO RAYADO FINO EN SENTIDO DE LA PENDIENTE, CONSTRUCCIÓN DE CASTILLOS K1 DE CONCRETO ARMADO F'c=200 KG/CM² DE 0.14X0.14 MTS. DE SECCIÓN ARMADOS CON CASTILLO ARMEX DE 12X12-4, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE 14 CMS DE ESPESOR A BASE DE TABICÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 0.10X0.14X0.28 MTS. DE SECCIÓN, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:4, CONSTRUCCIÓN DE CADENA DE CORONA A BASE DE CONCRETO RESISTENCIA NORMAL F'c=250 KG/CM², CON T.M.A. DE 3/4", DE SECCIÓN 14X20 CMS, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 0.20 MTS, CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE 8 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE RESISTENCIA NORMAL F'c = 200 KG/CM2, CON T.M.A. DE 3/4", ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" DIAM, @ 0.20 MTS EN AMBOS SENTIDOS, CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE 10 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE RESISTENCIA NORMAL F'c = 200 KG/CM2, CON T.M.A. DE 3/4", ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" DIAM, @ 0.20 MTS EN AMBOS SENTIDOS, APLANADOS EN MUROS Y PLAFÓN ACABADO FINO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 DE NO MENOS 2.00 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA COMEX PRO 1000 O SIMILAR (PREVIA AUTORIZACION DE SUPERVISIÓN) SOBRE MUROS Y PLAFONES, CONSTRUCCION DE PROTECCION DE HERRERIA MEDIDAS 0.90X0.72 MTS DE ACERO CON DOS HOJAS ABATIBLES A BASE DE ANGULO DE 1"X1/8" Y REJA ACERO, ELABORACION DE CIMENTADA ELÉCTRICA DOMICILIARIA A BASE TUBO DE FQ. GO. DE 1 1/4" DE DIÁMETRO, MUFA DE 1 1/4", VARILLA COPPER WELL CON CONECTOR, TUBO CONDUIT DE 1 1/4", 18 MTS. DE CABLE DE ALUMINIO TIPO DUPLEX (PSI-12+1) CAL. 6 AWG, BASE PARA MEDIDOR, INTERRUPTOR DE 7X30 AMPERES, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES.

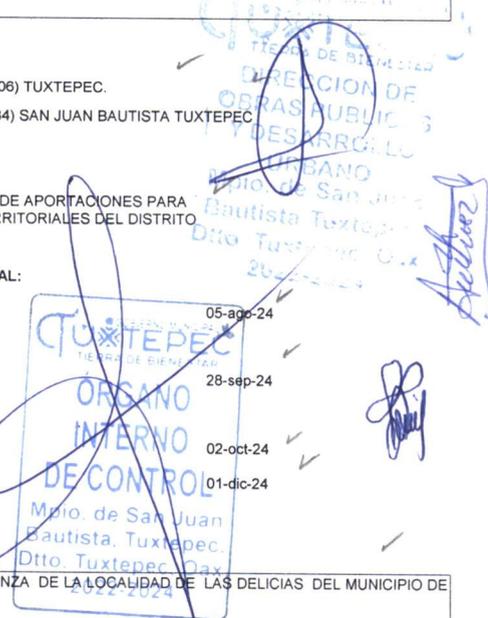

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista
Tuxtepec
Dto. Tuxtepec, Oax.
2022 2024

SINDICO HACENDARIO
Mpio. San Juan Bautista,
Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec, Oax.

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARON TRABAJOS DE: EN PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN, TERRAPLENES); EN ALBAÑILERÍA (154.54 ML DE CADENAS DE DESPLANTE, 115.90 M2 DE MURO DE 28 CM, 39.75 ML DE CASTILLOS, 74.18 M2 DE REPIZON, 221.76 ML DE GUARNICIÓN, 18.38 M2 DE PISO DE 10 CM DE ESPESOR F_C=150 KG/CM2 ACABADO RAYADO, 391.50 M2 DE PISO DE 10 CM DE ESPESOR F_C=150 KG/CM2 ACABADO ESTAMPADO); EN ACABADOS (231.80 M2 DE APLANADO, 115.90 M2 DE PINTURA, 115.90 M2 DE IMPERMEABILIZANTE); EN RELLENOS Y JARDINERÍA (79.85 M3 DE RELLENO DE BANCO (ARCILLA), 34.96 M3 DE TIERRA VEGETAL, 349.50 M2 DE PASTO, 7 ÁRBOLES DE NEEM, 8.26 M3 DE TEZONTLE, 17.20 M3 DE CAMA DE ARENA); EN EQUIPAMIENTO (3 EJERCITADORES Y 4 JUEGOS); EN ALUMBRADO (22 POSTES CON FAROL, INCLUYE: BASE, REGISTRO, TUBERÍA, CABLE); MAMPARA ELÉCTRICA Y LIMPIEZA.

BENEFICIARIOS:

380 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA

PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 2,225,528.42	\$ 2,209,718.21	\$ 2,209,718.21	\$ 2,209,718.21	\$ -
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIAIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	\$ 2,225,528.42	\$ 2,209,718.21	\$ 2,209,718.21	\$ 2,209,718.21	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 50 %

\$

1,104,859.11


INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	2968807	28/09/2024	\$66,915.46	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
CUMPLIMIENTO	2968808	28/09/2024	\$220,971.82	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	2990944	06/12/2024	\$220,971.82	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	01/10/2024	01/11/2024	\$1,177,868.02	\$ -	\$1,177,868.02	\$ 188,458.88	\$ 1,366,326.90	\$ 409,898.07	\$ 5,889.34	\$ 6,305.07	\$ 944,234.42
02 (DOS FINIQUITO)	02/11/2024	01/12/2024	\$727,061.47	\$ -	\$727,061.47	\$ 116,329.84	\$ 843,391.31	\$ 253,017.39	\$ 3,635.31	\$ 3,892.36	\$ 582,846.25
TOTALES			\$1,904,929.49	\$0.00	\$1,904,929.49	\$304,788.72	\$2,209,718.21	\$662,915.46	\$9,524.65	\$10,197.43	\$1,527,080.67



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT-20184-IR/RF-FAISMUN-096/2024

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:

(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)


 LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022 2024


 ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
 SINDICO HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2023-2024


 DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
 DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
 CED. PROF. No. 3641403
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2023-2024

RECIBE LA OBRA:
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)


 C. BENJAMIN OLIVERA RAMIREZ
 PRESIDENTE DEL COMITE


 C. ANGEL RUEDA LOPEZ
 SECRETARIO DEL COMITE

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)


 LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
 CONTRALORA MUNICIPAL
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2023-2024

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL


COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
 CONTRALOR SOCIAL


 C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
 CONTRALOR SOCIAL


 C. SAÚL SALUM ALLENDE
 CONTRALOR SOCIAL
